

INFORME N° 001-10-2023-DGAC-PME

INFORME DE MONITOREO AL SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAS DE LAS EXTENSIONES

1. Antecedentes

El proceso de autoevaluación de las extensiones inició en noviembre de 2021 con talleres cuyos ejes temáticos fueron los criterios y estándares del modelo de evaluación Institucional de Universidades y Escuelas Politécnicas 2019, y concluyó en noviembre de 2022 con la entrega de los informes de autoevaluación aprobados por el Consejo de Extensiones.

A partir de los resultados obtenidos, las extensiones elaboraron el plan de mejoras, documento que fue entregado a la Dirección de Gestión y Aseguramiento de la Calidad en enero de 2023 de acuerdo con la planificación.

Durante la capacitación para la elaboración del plan de mejoras, se determinó y acordó con las extensiones que la fecha de ejecución sería de marzo de 2023 hasta febrero de 2024, y los seguimientos a la ejecución se harían por parte de las Comisiones de Aseguramiento en las Extensiones en periodos trimestrales.

Con fecha 4 de mayo de 2023 se realizó de forma virtual la capacitación para el seguimiento y control a los planes de mejoras, taller convocado mediante documento N°DGAC-2023-007.

2. Monitoreo al seguimiento del plan de mejoras de las extensiones

Con memorándum N°ULEAM-DGAC-2023-028-MC de fecha 14 de septiembre de 2023, se solicitó a los presidentes y miembros de las Comisiones de Aseguramiento de la Calidad de las Extensiones, la entrega de las matrices del seguimiento del plan de mejoras correspondientes al primer y segundo trimestre de ejecución.

Trimestre	Meses correspondientes
Primer	Marzo a mayo 2023
Segundo	Junio a agosto 2023

A la fecha de emisión del informe, se registra las matrices de seguimiento de las extensiones de EL Carmen, Chone y Pedernales.

#	EXTENSIÓN	Matriz de seguimiento	Fecha de recepción
1	Chone	✓	22 de septiembre de 2023
2	Sucre	x	
3	Pedernales	✓	26 de septiembre de 2023
4	El Carmen	✓	26 de septiembre de 2023

Una vez que se han analizado las matrices entregadas por las extensiones, se detalla a continuación el estado de ejecución:

2.1. Extensión El Carmen

El plan de mejoras de la Extensión El Carmen, contiene 44 actividades, de las cuales 43 de ellas inician en el primer y segundo trimestre del año 2023.

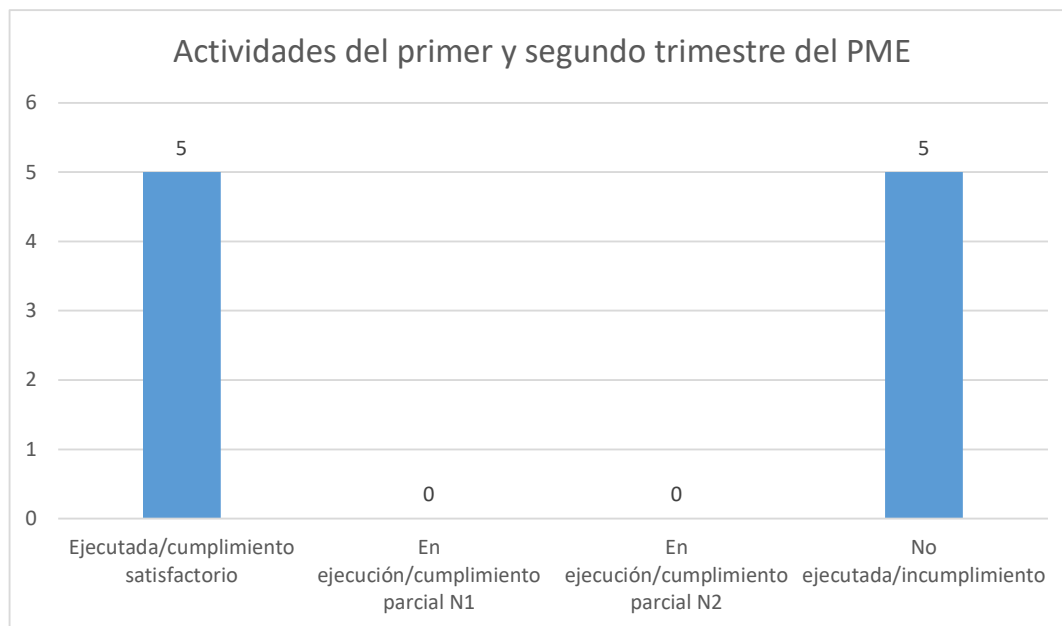


Figura 1. Avances del PME El Carmen correspondientes al primer y segundo trimestre
Elaborado por: DGAC, 2023

De las 43 actividades que tienen fecha de inicio en el primer trimestre del año, existen 10 actividades que debían finalizar en los dos trimestres de análisis, 5 de ellas se reportan como ejecutadas con el 100% y en las otras 5 actividades restantes no se reporta ningún porcentaje de avance por lo que se consideran en incumplimiento.

Respecto a las otras 33 actividades que tienen fecha de inicio entre enero a marzo de 2023 y fechas de finalización en el tercer trimestre, 17 de ellas reportan un nivel de ejecución de 100%, 2 actividades se reportan con el 80% de avance, y 15 no reportan avances. De estas últimas, para este informe no se consideran incumplimiento porque aún están dentro de la programación de ejecución, no obstante, era necesario que la extensión ubicara el porcentaje de avances.

2.2. Extensión Chone

El plan de mejoras de la Extensión Chone contiene 23 actividades, que en su totalidad se programaron para iniciar en abril de 2023, y con fechas de finalización entre diciembre 2023 a febrero 2024.

La extensión ha ubicado en observación que el 100% de las actividades se encuentran iniciadas, pero no reporta un nivel de avances. Cabe indicar que no se considera a ninguna actividad en incumplimiento porque no existen actividades que deban finalizar en el primer y segundo trimestre de ejecución; pero se debe reflejar el avance cuantitativo de las actividades.

2.3. Extensión Pedernales

El plan de mejoras de la Extensión Pedernales contiene 61 actividades, de las cuales 53 de ellas inician entre el primer y segundo trimestre del año 2023.

De las 53 actividades, 4 de ellas están marcadas en el nivel de ejecutada con cumplimiento satisfactorio, sin embargo, no se detalla el porcentaje de avance; 2 actividades se reportan en ejecución con cumplimiento parcial nivel 2 pero tampoco se detalla el porcentaje de avance; 23 actividades se reportan en ejecución con cumplimiento parcial nivel 1 y al igual que las demás actividades no reporta el porcentaje de avances; y 23 actividades se reportan como no ejecutadas, y una actividad que no reporta niveles de ejecución.

De las 53 actividades, solo 2 de ellas debían haber finalizado entre el primer y segundo trimestre que corresponde a este seguimiento. Una actividad se reporta como ejecutada con cumplimiento satisfactorio y la otra actividad como no ejecutada en incumplimiento; y como se menciona en el párrafo anterior, ninguna reporta de manera cuantitativa el avance. El resto de las actividades para este reporte no se las considera con incumplimiento porque, aunque ya iniciaron aún están dentro de la fecha programada para culminarlas.

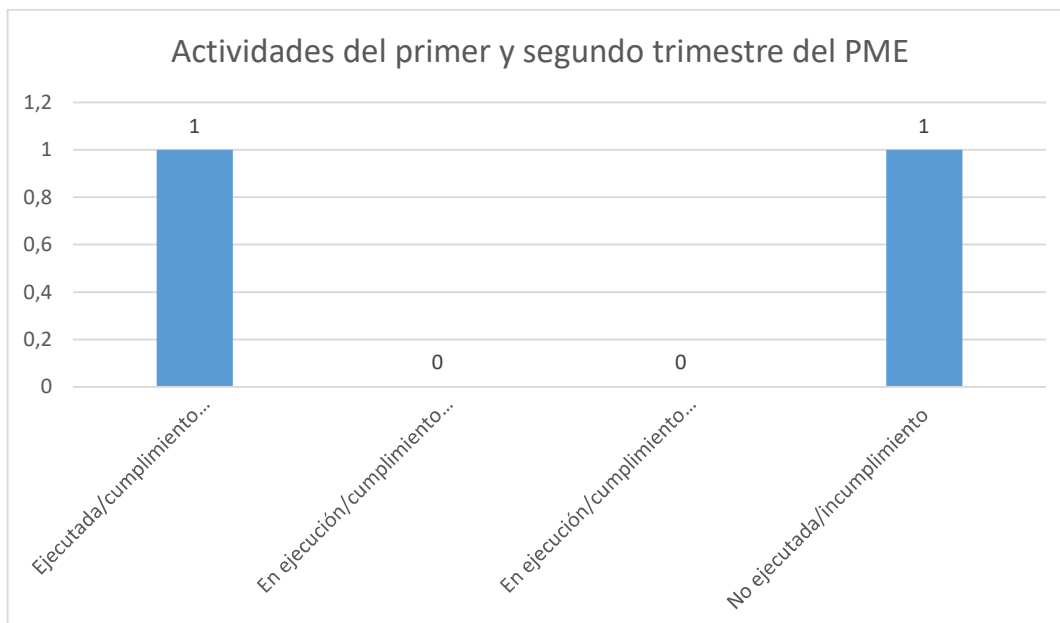


Figura 2. Avances del PME Pedernales correspondientes al primer y segundo trimestre
Elaborado por: DGAC, 2023

3. Conclusiones

Las extensiones han realizado el seguimiento al plan de mejoras, pero es necesario que en la matriz respectiva incluyan el porcentaje de avances de las actividades que iniciaron, con la finalidad de que tengan un mejor control y puedan asesorar a los responsables de las actividades en la implementación de acciones correctivas.

Manta, 31 de octubre de 2023

Elaborado por:

Aprobado por:

Ing. Rebeca Intriago García
Funcionaria - Gestión y Aseguramiento
de la Calidad

Ing. Luvy Loor Saltos, Mg.
Directora de Gestión y Aseguramiento
de la Calidad
